



RELATÓRIO TÉCNICO ESTRATÉGICO

Análise Completa da Plataforma

Auditoria detalhada de todas as páginas, abas e componentes — com mapeamento de completude, gaps críticos e plano de ação prático para entrega final.

64%

CONCLUSÃO
GERAL

20

PÁGINAS
ANALISADAS

263

ARQUIVOS
TYPESCRIPT

27+

CUSTOM
HOOKS



Sumário Executivo

Visão geral do estado atual da plataforma


Página 2 de 7

64%


CONCLUSÃO GERAL DA PLATAFORMA

Progresso por categoria de funcionalidade

Páginas com BD real (Supabase) 11 / 20



Páginas com interface completa 18 / 20



Abas funcionais (com dados reais) 62 / 95



7

PÁGINAS ≥ 80%

6

PÁGINAS 60–79%

4

PÁGINAS 40–59%

3

PÁGINAS < 40%

🏆 Destaques Positivos



Prazos — 90% completo

Melhor módulo do sistema. CRUD completo, 5 seções de urgência com cores, 3 datas distintas, mutations Supabase com React Query.



Clientes — 90% completo

Grid + Lista, multi-seleção em massa, filtros avançados, CRUD real, modal de detalhes e link para processos.



Arquitetura multi-tenant sólida

Offices, RLS (Row Level Security), sistema de permissões granular, soft delete com audit trail implementados.



Publicações — 85% completo

Sync OAB, DataJud integrado, 4 views, agendamento automático de prazos a partir de publicações DJe.

🚨 Gaps Críticos



Equipe — 20% (crítico)

mockEquipesData = []. Zero integração com Supabase. A tabela office_users existe mas não é usada nesta página.



Financeiro — 45% (crítico)

Mock data hardcoded, botões "Nova Cobrança" e "Nova Despesa" não funcionam. CRUD completamente ausente.



Audiências — 45% (crítico)

Interface completa mas 100% mock. A tabela audiencias existe no Supabase sem estar conectada.



Consultivo + Gráficos — 30–40%

Consultivo aguarda API de IA. Gráficos renderizam com dados mock estáticos, sem conexão ao Supabase.



Completude por Página


Ranking completo de todas as 20 páginas analisadas

Página 3 de 7

Alta Completude (75–90%)




Média Completude (60–74%)

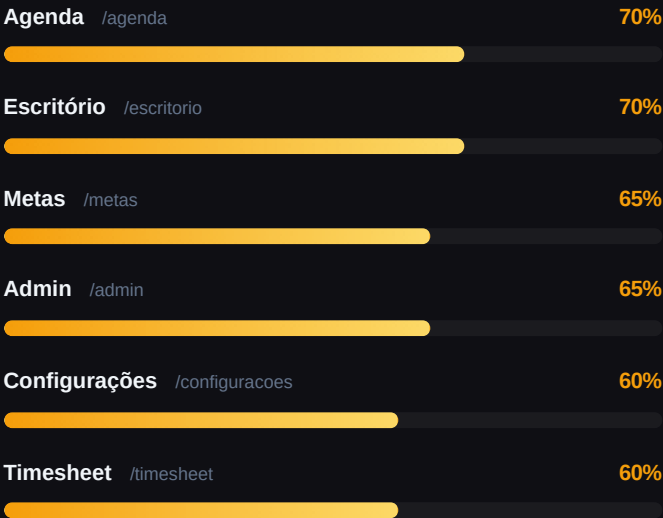

Baixa Completude (40–59%)



Crítico (< 40%)



Stack Tecnológico

Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
UI Framework	shadcn/ui + Tailwind CSS
Backend	Supabase (PostgreSQL)
Estado	React Query + Context API
Auth	Supabase Auth + RLS
Pagamentos	Stripe
Integrações	DataJud CNJ + OAB Sync
Deploy	Vercel + PWA



Análise Detalhada por Aba

Estado de cada aba, dados e funcionalidades

Página 4 de 7

PÁGINA / ABA	%	DADOS	STATUS	PRINCIPAL GAP
PROCESSOS				
Em Andamento / Concluídos / Suspensos	85%	SUPABASE	✓ COMPLETO	DataJud pode ter latência alta
Grid (cards) + Tabela	85%	REAL	✓ COMPLETO	—
Filtros avançados	85%	REAL	✓ COMPLETO	—
Drawer de detalhes	85%	REAL	✓ COMPLETO	Histórico de andamentos automático
CRM				
Leads (base, fontes, KPIs)	80%	SUPABASE	✓ FUNCIONAL	—
Conversões	75%	REAL	⚠ PARCIAL	Taxa calculada dinamicamente, OK
Pipeline / Funil de Vendas	40%	MOCK	⚠ PARCIAL	UI pronta, funil sem dados reais
Oportunidades	35%	MOCK	⚠ PARCIAL	Componente existe, dados vazios
Relatórios	5%	NENHUM	✗ VAZIO	Placeholder esqueleto
Metas Comerciais	5%	NENHUM	✗ VAZIO	Placeholder esqueleto
Email Marketing	5%	NENHUM	✗ VAZIO	Placeholder esqueleto
Follow-up	5%	NENHUM	✗ VAZIO	Placeholder esqueleto
AGENDA				
Calendário Mensal	75%	SUPABASE	✓ FUNCIONAL	—
Lista Diária	75%	REAL	✓ FUNCIONAL	—
Visão Expandida	70%	REAL	⚠ BUG	setAgendaData não declarado (linha 107)
Edição de evento	20%	AUSENTE	✗ FALTANDO	Sem dialog de edição de evento existente
AUDIÊNCIAS				

PÁGINA / ABA	%	DADOS	STATUS	PRINCIPAL GAP
Lista (Agendadas / Realizadas)	50%	MOCK []	⚠ SEM BD	mockAudienciasData = [] hardcoded
Calendário de Audiências	5%	NENHUM	✗ PLACEHOLDER	"Em desenvolvimento" — sem implementação
Filtros (status, tipo)	40%	MOCK	⚠ LOCAL	Filtra apenas estado local, não BD
Nova Audiência (diálogo)	40%	LOCAL	⚠ SEM PERSIST.	Cria no estado local, não salva no BD
👤 EQUIPE				
Por Equipes / Todos os Membros	20%	MOCK []	✗ SEM BD	mockEquipesData = [] — zero dados
CRUD de membros	0%	NENHUM	✗ AUSENTE	Não implementado
🕒 TIMESHEET				
Timer em tempo real	85%	LOCAL	✓ FUNCIONAL	—
Histórico / Logs	60%	HÍBRIDO	⚠ INSTÁVEL	Timeout 10s como workaround de bug
Relatórios por cliente/processo	0%	AUSENTE	✗ FALTANDO	Não implementado
💰 FINANCEIRO				
Contas a Receber	40%	MOCK	✗ SEM CRUD	3 itens hardcoded, sem BD
Contas a Pagar	40%	MOCK	✗ SEM CRUD	3 itens hardcoded, sem BD
KPI Cards (4)	40%	MOCK	⚠ CALCULADO	Calculado do mock, não do Supabase
Nova Cobrança / Nova Despesa	0%	AUSENTE	✗ NÃO FUNCIONA	Botões sem ação
🎯 METAS				
Individuais	75%	PARCIAL	✓ FUNCIONAL	Mock data inicial, sem persistência real
Demandas	15%	NENHUM	✗ PLACEHOLDER	DemandGoalsConfig — esqueleto vazio
Escritório	15%	MOCK	✗ PLACEHOLDER	Indicadores hardcoded
📊 GRÁFICOS				
Processos / Clientes / Atendimentos / Financeiro	35%	MOCK ESTÁTICO	⚠ SEM BD	Recharts funciona, dados são arrays fixos
⚙ CONFIGURAÇÕES				

PÁGINA / ABA	%	DADOS	STATUS	PRINCIPAL GAP
Geral, Processos, Prazos, Origens	75%	SUPABASE	✓ FUNCIONAL	—
Google Calendar	30%	UI PRONTA	⚠ SEM OAUTH	Integração OAuth não configurada
Permissões por usuário	0%	AUSENTE	✗ NÃO EXISTE	Aba de permissões granulares não criada



Análise de Riscos e Bugs

Problemas identificados que podem impactar o produto final

Página 5 de 7

● Bugs Confirmados (código quebrado)

BUG	LOCALIZAÇÃO	IMPACTO	SEVERIDADE
setAgendaData não declarado	Agenda.tsx, linha 107–108	Crash em runtime na Visão Expandida	● CRÍTICO
Timesheet loading infinito	useTimesheet.tsx	Tela travada, workaround de 10s	● ALTO
Financeiro — botões sem ação	Financeiro.tsx	"Nova Cobrança" e "Nova Despesa" silenciosos	● MÉDIO
Consultivo — dados hardcoded	Consultivo.tsx	Mostra dados de "Maria Silva" para qualquer cliente	● MÉDIO
Audiências não persistem	Audiencias.tsx, linha 29	Nova audiência criada some ao recarregar	● ALTO

● Riscos Técnicos e de Produto

RISCO	ÁREA AFETADA	PROBABILIDADE	NÍVEL
DataJud com alta latência em produção	Processos, Publicações	Alta — APIs públicas CNJ são lentas	● ALTO
Dados financeiros mock em produção	Financeiro, Dashboard	Certeza — sem Supabase conectado	● ALTO
Permissões RLS não testadas em escala	Todos os módulos	Média — multi-tenant complexo	● MÉDIO
Stripe sem webhook configurado	Pagamento, Subscriptions	Alta — pagamentos sem confirmação server-side	● MÉDIO
Google Calendar OAuth incompleto	Configurações, Agenda	Certeza — UI pronta, auth não configurada	● MÉDIO
Sem tratamento de erro global	Todas as páginas	Alta — ErrorBoundary existe mas limitado	● MÉDIO
Equipe sem dados — página morta	Equipe	Certeza — mockEquipesData = []	● BAIXO
Gráficos com dados fictícios	Gráficos	Certeza — arrays hardcoded	● BAIXO

💡 Oportunidades Identificadas



Push Notifications

PWA já configurado. Adicionar web push para prazos críticos seria de alto valor com esforço baixo.



Email Automático

Supabase Edge Functions podem enviar emails de prazo/audiência via Resend sem nenhum backend extra.



App Mobile (PWA)

InstallPrompt já existe. Com push notifications e offline cache, o app pode ser instalado como nativo.



Plano de Ação Prático

4 sprints para levar a plataforma de 64% para 95%+

Página 6 de 7

Sprint 1 — Corrigir e Conectar

Bugs críticos + módulos com BD existente mas desconectado

SEMANAS 1-2 · CRÍTICO

Fix: Bug Agenda (setAgendaData)

Declarar variável ou remover referência em Agenda.tsx linha 107-108. Evita crash na Visão Expandida.

~30 min

Audiências → Supabase

Substituir mockAudienciasData = [] por query Supabase (tabela audiencias existe). Hook useAudiencias seguindo padrão do usePrazos.

~1 dia

Fix: Timesheet loading

Debugar useTimesheet.tsx — remover timeout workaround e corrigir a query Supabase que causa loading infinito.

~2-4h

Equipe → office_users

Conectar Equipe.tsx ao Supabase usando hook useOfficeUsers (já existe). Remover mockEquipesData, listar membros reais.

~1 dia

Sprint 2 — Módulos Financeiros e Metas

Implementar CRUD real nos módulos de negócio mais críticos

SEMANAS 3-4 · ALTA PRIORIDADE

Financeiro — CRUD completo

Criar tabela financeiro no Supabase, hook useFinanceiro, dialogs de "Nova Cobrança" e "Nova Despesa", KPIs dinâmicos.

~3 dias

Metas — Persistência Supabase

Conectar useState inicial ao Supabase. Implementar abas "Demandas" e "Escritório" com indicadores reais dos outros módulos.

~2 dias

Gráficos — Dados reais

Substituir arrays hardcoded por queries ao Supabase. Reutilizar useStats hook já existente. Recharts já está instalado.

~1 dia

Etiquetas — TagManager

Implementar CRUD de tags no Supabase, vincular a processos e clientes. UI do TagManager já existe.

~1 dia

Sprint 3 — CRM e Configurações

Completar as abas vazias do CRM e integrações externas

SEMANAS 5-6 · MÉDIA PRIORIDADE



CRM — Relatórios e Metas

Implementar CrmRelatorios (gráficos de conversão) e CrmMetas (metas comerciais) com dados reais dos leads do Supabase.

~2 dias



CRM — Email Marketing

Criar fluxo básico de email marketing via Supabase Edge Functions + Resend API. Templates simples de follow-up.

~2 dias



Google Calendar OAuth

Configurar OAuth 2.0 no Google Cloud Console, implementar callback na Configurações, sincronizar eventos bidirecionalmente.

~2 dias



Consultivo — IA básica

Integrar Claude API ou OpenAI para análise de cliente. Endpoint simples que recebe dados do cliente e retorna insights.

~2 dias

Sprint 4 — Polimento e Produção

Qualidade, notificações, performance e preparação para lançamento

SEMANAS 7-8 · REFINAMENTO



Push Notifications

Ativar web push via PWA para prazos críticos e novas publicações DJe. Service worker já existe, só falta o trigger.

~1 dia



Stripe Webhook

Configurar webhook server-side no Supabase Edge Function para confirmar pagamentos e atualizar subscriptions.

~1 dia



Testes de RLS e Permissões

Testar Row Level Security em multi-tenant com múltiplos escritórios. Garantir isolamento de dados entre offices.

~2 dias



Performance e Erros

Lazy loading de páginas pesadas, tratamento de erros com ErrorBoundary global, loading states consistentes.

~2 dias



Conclusão e Próximos Passos

Roadmap condensado para entrega final

Página 7 de 7

📋 Ordem de Prioridade Recomendada

1

Fix Bug Agenda + Conectar Audiências ao Supabase

Dois problemas críticos que afetam diretamente usuários. Agenda.tsx linha 107 e tabela audiencias já existe no BD.

Bug fix

~1,5 dias

Alto impacto

2

Financeiro — CRUD real + Equipe → office_users

Módulo financeiro é crítico para qualquer escritório. Equipe está 100% quebrada (lista vazia). Ambos têm base no BD.

Nova feature

~4 dias

Crítico negócio

3

Gráficos com dados reais + Metas persistência

Recharts já instalado, useStats já existe. Gráficos precisam apenas trocar arrays fixos por queries. Metas: conectar ao Supabase.

Integração BD

~3 dias

Alto valor visual

4

CRM — 4 abas vazias (Relatórios, Metas, Email, Follow-up)

As abas existem como placeholders. Relatórios podem usar dados dos leads já carregados. Email via Resend + Edge Functions.

Nova feature

~5 dias

Diferencial competitivo

5

Timesheet fix + Etiquetas CRUD + Consultivo IA

Timesheet: corrigir bug de persistência. Etiquetas: TagManager já tem UI. Consultivo: integrar API de IA com dados do cliente.

Fix + Feature

~6 dias

Complete

6

Google Calendar OAuth + Stripe Webhook + Push Notifications

Integrações que elevam a experiência. PWA já suporta push. Google Calendar UI pronta. Stripe precisa de webhook server-side.

Integrações

~5 dias

Polimento

📈 Projeção de Completude

HOJE (ATUAL)

64%

11/20 páginas com BD real
Bugs críticos presentes

APÓS SPRINTS 1-2

82%

Bugs corrigidos
Financeiro + Equipe + Audiências OK

APÓS SPRINTS 3-4

96%

CRM completo, IA, Google Cal
Pronto para produção

💡 Avaliação Final

O VextriaHub tem uma base técnica excepcional — arquitetura multi-tenant, sistema de permissões granular, integrações com DataJud e OAB, e interface premium com dark mode. O desafio atual não é arquitetural, mas de completude: **9 das 20 páginas têm interfaces prontas mas dados desconectados do banco**. Com ~8 semanas de desenvolvimento focado seguindo este plano, a plataforma atinge nível de produção completo e se torna um dos sistemas jurídicos mais completos do mercado brasileiro.

✓ Pontos Fortes

Arquitetura multi-tenant	✓ Sólida
Sistema de permissões (RLS)	✓ Implementado
DataJud + OAB Sync	✓ Funcional
UI/UX premium	✓ Excelente
263 arquivos TypeScript	✓ Bem organizado
PWA configurado	✓ Pronto

⚡ Estimativa de Esforço

Sprint 1 (bugs + audiências + equipe)	~ 10 dias
Sprint 2 (financeiro + gráficos)	~ 8 dias
Sprint 3 (CRM + IA + Google Cal)	~ 10 dias
Sprint 4 (polish + produção)	~ 8 dias
Total estimado	~ 36 dias
